

CHARTRE DU PROJET

Étude stratégique sur le Startup Act tunisien

1 CONTEXTE



Le Startup Act tunisien constitue une réforme majeure visant à **soutenir l'entrepreneuriat innovant** et à renforcer l'écosystème des startups en Tunisie.

Dans un contexte en constante évolution, cette étude stratégique a pour finalité la production d'un **Livre Blanc** destiné à **éclairer les décideurs publics**, les acteurs de l'écosystème et les partenaires institutionnels.



2 MISSION DU PROJET



Conduire une étude de veille stratégique fondée sur des données fiables afin de :

- ✓ **analyser** le Startup Act et son application ;
- ✓ **comprendre** l'évolution de l'écosystème startup tunisien ;
- ✓ **réaliser** un benchmark international ;
- ✓ **identifier** les opportunités et les défis ;
- ✓ **formuler** des recommandations argumentées.

3 LIVRABLE FINAL

Le projet aboutira à un Livre Blanc comprenant notamment :



-  analyse du cadre juridique
-  état des lieux de l'écosystème
-  analyses statistiques
-  benchmark international
-  cartographie des acteurs
-  diagnostic stratégique
-  recommandations

4 PRINCIPES DIRECTEURS

-  Rigueur scientifique
-  Neutralité
-  Objectivité
-  Esprit critique
-  Travail collaboratif
-  Traçabilité
-  Amélioration continue



Cette chartre est notre **référentiel commun**. Elle garantit la **qualité**, la **cohérence** et l'**impact** de notre travail collectif au service d'un écosystème startup tunisien plus performant.



ORGANISATION DU PROJET



LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

- DIRECTION SCIENTIFIQUE**
 - définit les orientations scientifiques et stratégiques ;
 - valide les méthodes et outils ;
 - valide les livrables stratégiques et finaux.
- COORDINATEUR DU PROJET**
 - assure la coordination entre l'ATVIC et les équipes ;
 - organise les travaux et les ressources ;
 - suit l'avancement du projet et le respect du planning ;
 - facilite la circulation de l'information.
- COMITÉ SCIENTIFIQUE**
 - accompagne les travaux méthodologiques et analytiques ;
 - challenge les analyses et les hypothèses ;
 - propose des améliorations méthodologiques ;
 - assure la cohérence scientifique des travaux ;
- COMITÉ DE PILOTAGE**
 - suit l'avancement des travaux ;
 - identifie les risques et propose des solutions ;
 - prépare les décisions et les arbitrages.
- CHefs de projet de phase**
 - planifient et répartissent les tâches ;
 - animent leur équipe et suivent les délais ;
 - préparent les livrables de leur phase ;
 - rédigent le dossier de passation.
- RESPONSABLE QUALITÉ**
 - vérifie la qualité scientifique des productions ;
 - contrôle les références, citations et sources ;
 - veille au respect des procédures et des critères qualité.
- RESPONSABLE CAPITALISATION**
 - documente les bonnes pratiques et les difficultés ;
 - capitalise les apprentissages ;
 - alimente la base de connaissances du projet.
- CELLULE DE VEILLE**
 - réalise les veilles, recherches, analyses et synthèses ;
 - contribue à la production des livrables et du Livre Blanc ;
 - développe ses compétences à travers des responsabilités en rotation.



PRINCIPE FONDAMENTAL

Les orientations scientifiques et méthodologiques sont validées par la Direction scientifique.

Chaque étudiant assume différentes responsabilités au cours du projet afin de développer des compétences en :



gestion de projet



veille stratégique



analyse et synthèse



qualité



capitalisation



NOTRE OBJECTIF COMMUN

Travailler de manière structurée, transparente et collaborative pour produire un Livre Blanc scientifique, utile et à fort impact pour l'écosystème startup tunisien.


3

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Une démarche structurée, rigoureuse et fondée sur les meilleures pratiques

1 NOTRE DÉMARCHE

Chaque étude suit le cycle PDCA adapté à la veille stratégique :

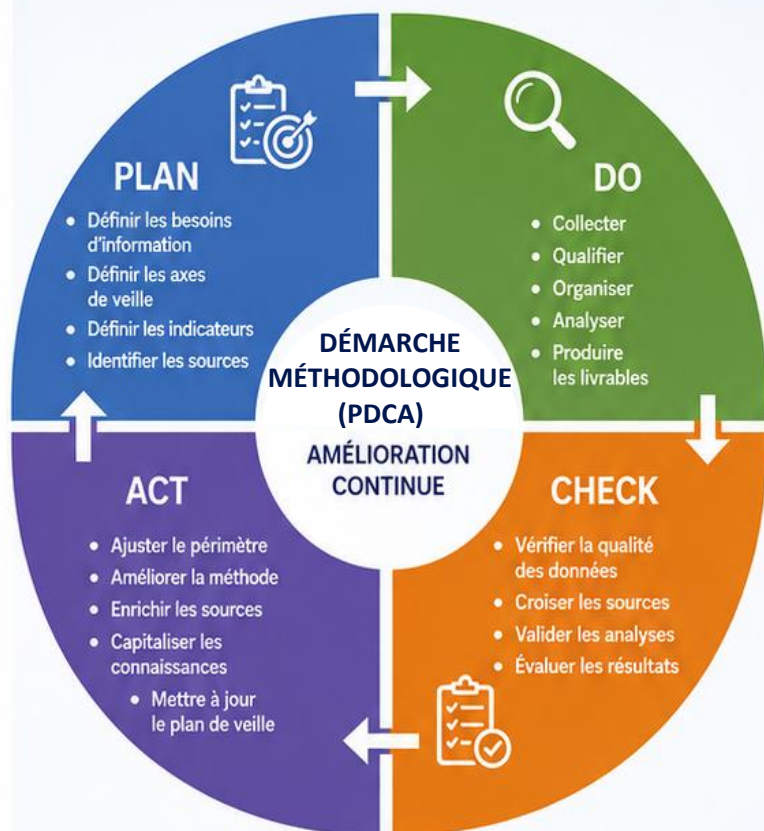

Ce cycle garantit une veille rigoureuse, pertinente et évolutive au service d'un Livre Blanc fiable, actualisé et à forte valeur stratégique.

2 NOS MÉTHODES

Selon les besoins, les équipes mobiliseront les méthodes suivantes :



Veille stratégique

Détection et surveillance d'informations pertinentes.



Recherche documentaire

Analyse de documents, rapports, études, textes officiels et publications.



Benchmark international

Comparaison avec des dispositifs et écosystèmes de référence.



Analyse qualitative

Entretiens, études de cas, avis d'experts, retours d'expérience.



Analyse quantitative

Données statistiques, indicateurs, traitements et visualisations.



Cartographie des acteurs

Identification, classification et analyse des parties prenantes.



Analyse comparative

Mise en perspective des forces, faiblesses, opportunités et menaces.



Triangulation des sources

Croisement des informations pour renforcer la fiabilité des conclusions.

3 RÈGLES DE TRAVAIL



PARTAGER L'INFORMATION

La connaissance collective renforce la qualité des analyses.



DOCUMENTER SES RECHERCHES

Toute information doit être sourcée, classée et traçable.



RESPECTER LES DÉLAIS

Le respect du planning garantit la réussite du projet.



COLLABORER AVEC LES ÉQUIPES

Chaque expert contribue à une vision complète et complémentaire.



ADOPTER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Basée sur des preuves, une analyse critique et des méthodes reconnues.



CAPITALISER LES CONNAISSANCES

Documenter ce que nous apprenons pour progresser ensemble.

4 CE QUE NOUS ÉVITONS



Copier-coller sans analyse



Informations non vérifiées



Opinions personnelles



Sources non fiables



Conclusions sans preuves

“

La qualité de notre travail repose sur la rigueur de notre méthode.

”



UNE INFORMATION N'EST RETENUE QUE SI ELLE EST :



Vérifiable

Contrôlable
et justifiable



Sourcée

Origine
identifiée



Récente

Actualisée selon
le sujet



Pertinente

En lien direct avec
nos objectifs



Traçable

Vue et documentée
de bout en bout



Compréhensible

Claire, structurée
et non ambiguë

AVANT CHAQUE LIVRAISON

Chaque production est vérifiée selon les critères suivants :

- ☒ Exactitude des informations et des chiffres
- ☒ Fiabilité et crédibilité des sources
- ☒ Cohérence des analyses et des arguments
- ☒ Citation complète des références
- ☒ Clarté des conclusions
- ☒ Justification des recommandations
- ☒ Respect de l'éthique scientifique



TOUJOURS DISTINGUER



FAITS

Éléments objectifs,
vérifiables et sourcés.



DONNÉES

Informations brutes
collectées ou mesurées.



ANALYSES

Interprétation des données
à l'aide de méthodes.



HYPOTHÈSES

Explications possibles
à tester ou à vérifier.



RECOMMANDATIONS

Propositions argumentées
pour orienter la décision.

SOURCES PRIORITAIRES



Textes législatifs
et réglementaires



Organismes
publics



Organisations
internationales



Publications
scientifiques



Rapports
institutionnels



Bases de données
officielles



Entretiens et
consultations
d'experts

NOS OUTILS D'ASSURANCE QUALITÉ



Grille de
vérification



Référentiel
méthodologique



Base documentaire
centralisée



Traçabilité
des sources



Revue croisée
(peer review)

CE QUE NOUS ÉVITONS

- ✗ Informations non vérifiées ou non sourcées
- ✗ Sources non fiables ou partielles
- ✗ Opinions personnelles présentées comme des faits
- ✗ Données anciennes ou hors contexte
- ✗ Conclusions sans preuves ni justifications



NOTRE ENGAGEMENT

Nous nous engageons à produire des analyses rigoureuses, transparentes et utiles,
au service d'un Livre Blanc fiable et impactant.





CHAQUE MEMBRE DU PROJET S'ENGAGE À



RESPECTER LES PRINCIPES DE LA CHARTE

Appliquer les règles et valeurs définies pour garantir la qualité de nos travaux.



PRODUIRE UN TRAVAIL DE QUALITÉ

Fournir des analyses rigoureuses, sourcées et argumentées.



ADOPTER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

S'appuyer sur des méthodes reconnues et des données fiables.



CONTRIBUER AU TRAVAIL COLLECTIF

Collaborer activement, partager les connaissances et s'entraider.



FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE

Poser les bonnes questions, remettre en question et proposer des solutions.



RESPECTER LES RÈGLES D'ÉTHIQUE

Garantir l'intégrité, la confidentialité et le respect des personnes et des sources.



FAVORISER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES

Capitaliser nos apprentissages pour enrichir le projet et les compétences de chacun.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES



Veille stratégique et Intelligence économique



Recherche et analyse



Analyse quantitative et qualitative



Cartographie et benchmark



Rédaction et synthèse



Communication et présentation



Gestion de projet



Qualité et rigueur



Gestion et traitement de données



Esprit critique et prise de décision

En mobilisant des méthodes reconnues et un travail collectif structuré, notre objectif est de produire **une étude fiable, utile et durable**, au service de l'écosystème startup tunisien.



Le Livre Blanc sera notre contribution collective à une meilleure compréhension et au renforcement de l'écosystème startup en Tunisie.



Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.



CONDITIONS DE RÉUSSITE



Leadership partagé



Objectifs clairs



Communication fluide



Respect des délais



Qualité et rigueur



Éthique et intégrité



Innovation et amélioration continue



ENSEMBLE, FAISONS DE CE PROJET UNE RÉFÉRENCE

Notre engagement aujourd'hui, l'impact de demain.



FICHE DE CADRAGE

Étude stratégique sur le Startup Act tunisien

1. Contexte

Le Startup Act tunisien constitue une réforme majeure destinée à soutenir les startups innovantes et à renforcer l'écosystème entrepreneurial.

Huit ans après son lancement, il apparaît nécessaire d'évaluer objectivement ses résultats, son fonctionnement et son impact afin d'identifier les leviers d'amélioration et d'éclairer les futures décisions publiques.

2. Problématique générale

Dans quelle mesure le Startup Act tunisien a-t-il atteint ses objectifs de développement de l'écosystème startup, quels résultats a-t-il produits, quelles limites persistent et quelles évolutions permettraient de renforcer son efficacité ?

3. Objectif général

Évaluer le Startup Act tunisien au moyen d'une démarche de veille stratégique afin de produire un Livre Blanc proposant un diagnostic fondé sur des preuves et des recommandations opérationnelles.

4. Objectifs spécifiques

- Établir un état des lieux quantitatif du dispositif.
- Analyser le cadre juridique et institutionnel.
- Évaluer les mécanismes de financement.
- Étudier les structures d'accompagnement.
- Cartographier l'écosystème startup.
- Évaluer les impacts économiques, territoriaux et institutionnels.
- Réaliser un benchmark international.
- Élaborer des recommandations stratégiques.

5. Axes de l'étude

AXE 1 — État des lieux quantitatif du Startup Act

Objectif

Mesurer l'évolution du dispositif depuis son lancement.

Questions

Sessions

- Nombre de sessions.
- Nombre de candidatures.
- Nombre de Labels.
- Nombre de Pré-labels.
- Taux de réussite.
- Taux de conversion Pré-label → Label.
- Évolution annuelle.

Startups

- Nombre total de startups labellisées.
- Labels actifs.
- Labels expirés.
- Labels retirés.
- Sorties du dispositif.
- Évolution annuelle.

Cartographie

- Gouvernorats.
- Régions.
- Secteurs.
- Genre.
- Ancienneté.
- Forme juridique.

Analyse territoriale

- Concentration géographique.
- Déséquilibres régionaux.
- Dynamiques territoriales.

Indicateurs

- Nombre de startups par gouvernorat.

- Nombre de startups par secteur.
- Nombre de startups par année.
- Taux de croissance annuel.
- Taux de sortie.
- Taux de retrait.

AXE 2 — Cadre juridique et gouvernance

Objectif

Évaluer la cohérence du dispositif réglementaire.

Questions

- Les objectifs sont-ils atteints ?
- Les critères d'éligibilité sont-ils adaptés ?
- Les avantages sont-ils utilisés ?
- Les procédures sont-elles efficaces ?
- Quels obstacles réglementaires subsistent ?

AXE 3 — Financement des startups

Objectif

Évaluer l'efficacité des mécanismes de financement.

Questions

Cartographie

- Quels dispositifs existent ?
- Qui les finance ?
- Qui les gère ?

Analyse quantitative

- Nombre de startups bénéficiaires par dispositif.
- Montants mobilisés.
- Montant moyen.
- Répartition par région.
- Répartition par secteur.
- Répartition par année.

Analyse d'impact

- Quels dispositifs fonctionnent le mieux ?
- Quels sont les freins ?

- Existe-t-il des ruptures de financement ?
- Les financements répondent-ils aux besoins des startups ?
- Quel est le taux de survie des startups financées ?
- Existe-t-il un effet mesurable sur la croissance, l'emploi ou l'export ?

AXE 4 — Accompagnement et écosystème

Objectif

Analyser l'organisation de l'écosystème.

Questions

- Quels sont les principaux acteurs ?
- Quels services offrent-ils ?
- Les dispositifs sont-ils complémentaires ?
- Les startups sont-elles satisfaites ?
- Quels besoins restent non couverts ?

AXE 5 — Évaluation des impacts

Objectif

Mesurer les effets du Startup Act.

Questions

- Impact économique.
- Impact sur l'emploi.
- Impact sur l'innovation.
- Impact sur l'investissement.
- Impact territorial.
- Impact sur l'internationalisation.
- Impact sur la création de valeur.

AXE 6 — Benchmark international

Objectif

Identifier les meilleures pratiques.

Questions

- Quels pays sont comparables ?
- Quels dispositifs sont les plus performants ?

- Quels résultats obtiennent-ils ?
- Quels enseignements pour la Tunisie ?

Analyse — Diagnostic stratégique

Objectif

Produire un diagnostic global.

Questions

- Forces.
- Faiblesses.
- Opportunités.
- Menaces.
- Facteurs clés de succès.
- Risques futurs.

Analyse — Recommandations stratégiques

Objectif

Proposer des pistes d'amélioration.

Questions

- Quelles réformes prioritaires ?
- Quels nouveaux mécanismes ?
- Quels indicateurs de suivi ?
- Quelles évolutions institutionnelles ?
- Quel plan d'action ?

6. Hypothèses de recherche

L'étude cherchera notamment à vérifier si :

- le Startup Act a contribué au développement de l'écosystème startup ;
- certains mécanismes sont plus performants que d'autres ;
- des disparités territoriales ou sectorielles existent ;
- les dispositifs de financement répondent aux besoins réels ;
- certaines bonnes pratiques internationales pourraient être adaptées au contexte tunisien.

7. Livrables attendus

- Fiches de veille.
- Analyses statistiques.
- Cartographies.
- Benchmarks.
- Diagnostics.
- Recommandations.
- Livre Blanc.

8. Question centrale du Livre Blanc

Comment faire évoluer le Startup Act tunisien afin qu'il devienne un levier encore plus performant pour le développement de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la compétitivité économique de la Tunisie ?

1

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PROJET

DANS UN PROJET DE VEILLE STRATÉGIQUE



1 QU'EST-CE QU'UN PROJET ?

Un projet est une activité **temporaire** entreprise pour créer un produit, un service ou un résultat **unique**.

Il a un **début** et une **fin** déterminés, avec des **objectifs** précis à atteindre, dans un **contexte donné**, en mobilisant des ressources limitées.



EXEMPLE DE VEILLE

Réaliser une **étude nationale** sur le **Startup Act tunisien** afin de produire un **Livre Blanc d'aide à la décision**.



TEMPORAIRE
Début et fin déterminés



UNIQUE
Résultat spécifique



RESSOURCES LIMITÉES
Humaines, financières, matérielles, temporelles



OBJECTIF PRÉCIS
Répondre à un besoin décisionnel

2 PROJET VS ACTIVITÉ COURANTE

La différence essentielle réside dans le caractère temporaire, unique et orienté résultats du projet.

PROJET DE VEILLE		ACTIVITÉ COURANTE	
	Durée limitée : date de début et de fin définies.	DURÉE	Continue : sans fin prévue, se répète dans le temps. 
	Unique : produit un livrable spécifique (analyse, benchmark, Livre Blanc, recommandations).	NATURE	Répétitive : tâches similaires réalisées régulièrement. 
	Objectif précis : répondre à un besoin décisionnel ou produire un livrable déterminé.	OBJECTIF	Pérenne : maintenir le fonctionnement quotidien de l'organisation. 
	Mobilise des ressources dédiées pendant une période définie.	RESSOURCES	Ressources stables, allouées en continu. 
	Résultat mesurable : succès évalué à la fin du projet.	RÉSULTAT	Résultat opérationnel ou service rendu en continu. 

3 POURQUOI GÉRER UN PROJET DE VEILLE ?

La gestion de projet permet d'augmenter les chances de succès et d'assurer que le projet crée une réelle valeur.



Atteindre les objectifs fixés

Répondre précisément au besoin décisionnel.



Respecter les délais

Produire les livrables au moment voulu.



Optimiser les ressources

Utiliser efficacement le temps, les compétences et le budget.



Maîtriser les risques

Anticiper les difficultés et réduire les incertitudes.



Assurer la qualité des livrables

Garantir la fiabilité des sources et la rigueur des analyses.



Créer de la valeur pour la décision

Fournir des analyses utiles, claires et exploitables.



EXEMPLE DANS NOTRE PROJET DE VEILLE

Sans gestion de projet, nous risquons des retards, des doublons, une qualité inégale des analyses, des sources non fiables et, au final, un Livre Blanc moins utile pour les décideurs.



2

LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET

DANS UN PROJET DE VEILLE STRATÉGIQUE

La gestion de projet suit un cycle de vie structuré en 5 étapes clés.
Ce cycle repose sur l'amélioration continue selon le modèle PDCA
(Plan – Do – Check – Act).



LE MODÈLE PDCA



5 CLÔTURE / ÉVALUATION

- Valider le Livre Blanc et les recommandations.
- Présenter les résultats aux parties prenantes.
- Capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques.
- Évaluer la performance globale du projet.



Objectif :

Clôturer le projet et tirer les enseignements pour les futurs projets.

4 SUIVI & AJUSTEMENT

- Suivre l'avancement des activités et des livrables.
- Mesurer les indicateurs clés du projet.
- Identifier les écarts (délai, qualité, ressources).
- Ajuster le plan d'action et réaffecter les ressources si besoin.



Objectif :

Garantir que le projet reste sur la bonne trajectoire et atteindre les résultats attendus.

3 EXÉCUTION

- Collecter les informations et données.
- Analyser, comparer et benchmarker.
- Produire les analyses et les visualisations.
- Rédiger les livrables (rapports, synthèses, recommandations).
- Communiquer régulièrement avec l'équipe et les parties prenantes.



Objectif :

Mettre en œuvre le plan et produire les livrables attendus.

1 INITIATION

- Identifier le besoin décisionnel et la problématique de veille.
- Définir les objectifs et le périmètre de l'étude.
- Identifier les parties prenantes et leurs attentes.
- Valider la faisabilité du projet.



Objectif :

Comprendre le besoin et cadrer le projet.

2 PLANIFICATION

- Décomposer le travail (axes, thèmes, tâches).
- Définir la méthodologie de veille et les sources.
- Planifier les activités et les jalons.
- Répartir les rôles et les ressources.
- Établir le calendrier et le budget (le cas échéant).



Objectif :

Préparer le travail pour atteindre les objectifs.



EXEMPLE DANS NOTRE PROJET : ÉTUDE SUR LE STARTUP ACT



Le cycle n'est pas toujours linéaire : certaines étapes peuvent se chevaucher ou être itérées.
L'important est de rester agile et orienté résultats.



3

LA TRIPLE CONTRAINTE DU PROJET

QUALITÉ – DÉLAIS – RESSOURCES

Tout projet est soumis à trois contraintes interdépendantes.
Modifier l'une d'elles impacte automatiquement les deux autres.



LE TRIANGLE DES CONTRAINTES

La réussite d'un projet de veille repose sur l'équilibre entre ces trois contraintes.

L'objectif du chef de projet est de trouver le meilleur compromis possible.

QUALITÉ

Niveau d'exigence des livrables et satisfaction des parties prenantes et des décideurs.

DÉLAIS

Temps disponible pour réaliser le projet et atteindre les objectifs dans la date prévue.

ÉQUILIBRE
DU PROJET
= RÉUSSITE

RESSOURCES

Ensemble des moyens (axes humains et matériels).

SIGNIFICATION DES CONTRAINTES



QUALITÉ

Correspond au niveau de performance attendu des analyses, de la précision des données et de la satisfaction des décideurs.



DÉLAIS

Correspond au temps disponible pour collecter, analyser, produire les livrables et publier le Livre Blanc.



RESSOURCES

Correspond aux moyens humains (équipe, experts), financiers, matériels et outils numériques à disposition du projet.

COMMENT LES CONTRAINTES S'INFLUENCENT

Les trois contraintes sont interdépendantes : toute modification de l'une d'elles affecte automatiquement les deux autres.



SI LA QUALITÉ AUGMENTE

→ Il faut plus de temps et/ou plus de ressources.



SI LES DÉLAIS DIMINUENT

→ Il faut plus de ressources et/ou accepter une qualité moindre.



SI LES RESSOURCES DIMINUENT

→ Les délais s'allongent et/ou le niveau de qualité baisse.

EXEMPLE DANS NOTRE PROJET DE VEILLE : ÉTUDE SUR LE STARTUP ACT



QUALITÉ

- Sources fiables et vérifiées.
- Méthodologie de veille rigoureuse.
- Analyses approfondies et benchmarks précis.
- Recommandations pertinentes, utiles pour les décideurs.



Objectif qualité

Produire un Livre Blanc de référence, fiable et crédible, reconnu par les parties prenantes.



DÉLAIS

- Période totale du projet : de Juillet à Décembre 2026.
- Jalons mensuels par axe de l'étude.
- Date cible de publication du Livre Blanc : Décembre 2026 (avant le Forum ATVIC).



Objectif délais

Respecter le calendrier et livrer le Livre Blanc dans les délais impartis pour maximiser son impact.



RESSOURCES

- 16 étudiants mobilisés en équipe.
- Encadrement scientifique et experts.
- Outils numériques (bases de données, logiciels, plateformes).
- Budget éventuel pour certaines sources ou événements.



Objectif ressources

Mobiliser et optimiser les ressources disponibles pour atteindre les objectifs du projet.



RAPPEL ESSENTIEL

Il n'existe jamais de solution parfaite sur une seule contrainte.
Le rôle du chef de projet est de trouver le meilleur équilibre pour garantir le succès du projet.



LES OUTILS FONDAMENTAUX DU CHEF DE PROJET

Les outils de base pour planifier, organiser et piloter un projet de veille



Le chef de projet utilise des outils simples et efficaces pour structurer le travail, mobiliser les ressources et suivre l'avancement. Voici les outils indispensables.

1 DIAGRAMME DE GANTT

Visualiser le planning du projet dans le temps.



Représente les tâches ou activités sur une frise chronologique.



Permet de visualiser la durée, les dépendances et les jalons.



Facilite le suivi de l'avancement et l'anticipation des retards.

EXEMPLE DANS NOTRE PROJET : ÉTUDE SUR LE STARTUP ACT



2 TABLEAU DES TÂCHES

Lister et suivre toutes les tâches du projet.



Décompose le travail en tâches claires et actionnables.



Attribue un responsable et une échéance à chaque tâche.



Permet de suivre l'état d'avancement de chaque tâche.

EXEMPLE DANS NOTRE PROJET : EXTRAIT DU TABLEAU DES TÂCHES

N°	TÂCHES	RESPONSABLE	DÉBUT	ÉCHÉANCE	STATUT
1	Identifier les questions de recherche	Équipe Cadrage	05/07	10/07	✓ Terminée
2	Collecter les sources juridiques	Équipe Juridique	11/07	31/07	🕒 En cours
3	Collecter les données statistiques	Équipe Données	11/07	15/08	🕒 En cours
4	Réaliser le benchmark international	Équipe Benchmark	16/08	15/09	⌚ À faire
5	Rédiger le chapitre 1 (Cadre juridique)	Équipe Juridique	16/09	30/09	⌚ À faire
...	...	...	...	...	...

3 GESTION DES RESSOURCES

Allouer et optimiser les ressources du projet.



Identifier les ressources nécessaires (humaines, matérielles, financières, informationnelles).



Affecter les ressources aux tâches en fonction des compétences et disponibilités.



Éviter la surcharge ou la sous-charge et optimiser l'utilisation des ressources.

EXEMPLE DANS NOTRE PROJET : ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES

RÔLE / PROFIL	NOMBRE	AFFECTATION PRINCIPALE					
		JUI.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.
Chef de projet	1	■	■	■	■	■	■
Responsables d'axes	6	■	■	■	■	■	■
Cellule de veille	16	■	■	■	■	■	■
Responsable qualité	2			■	■	■	
Designer / PAO	2				■	■	■



OBJECTIF DES OUTILS FONDAMENTAUX

Donner de la visibilité, organiser le travail et maîtriser le temps et les ressources pour atteindre les objectifs du projet.



BONNE PRATIQUE

Mettre à jour régulièrement ces outils pour disposer d'une information fiable et prendre les bonnes décisions au bon moment.

5 LES OUTILS AVANCÉS DE PILOTAGE DU PROJET

Suivre, anticiper et améliorer en continu

Ces outils permettent de piloter le projet au quotidien, d'anticiper les risques et d'assurer la qualité des livrables.



1 KANBAN

EXEMPLE DE TABLEAU KANBAN

Visualiser le flux de travail et limiter les tâches en cours pour améliorer l'efficacité.

- Clarifie les priorités.
- Rend le travail transparent.
- Favorise la collaboration.

À FAIRE	EN COURS	TERMINÉ
Collecte des sources	Analyse des données	Cadrage de l'étude
Benchmark international	Rédaction chapitre 2	Collecte données statistiques
Rédaction chapitre 3		

2 TABLEAU DE BORD

EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD

Suivre les indicateurs clés du projet pour prendre les bonnes décisions.

- Vue synthétique de l'avancement.
- Aide à l'alerte précoce.
- Orienté les actions correctives.



3 REGISTRE DES RISQUES

EXEMPLE DE REGISTRE DES RISQUES

Identifier, évaluer et suivre les risques pour réduire leur impact sur le projet.

- Anticiper les problèmes.
- Définir des actions préventives.
- Suivre l'évolution des risques.

RISQUE	PROB.	IMPACT	NIVEAU	ACTION PRÉVENTIVE
Retard dans la collecte des données	M	Élevé	Orange	Diversifier les sources et anticiper
Indisponibilité des ressources clés	M	Moyen	Jaune	Planifier les congés et les remplacements
Qualité insuffisante des sources	F	Élevé	Rouge	Vérification rigoureuse des sources
Dépassement des délais	P	Élevé	Rouge	Suivi régulier et réajustement du plan

PROBABILITÉ : F = Faible M = Moyenne P = Probable ÉLEVÉE = Très probable
IMPACT : Faible Moyen Élevé

4 SUIVI DES LIVRABLES

EXEMPLE DE SUIVI DES LIVRABLES

Assurer la traçabilité des livrables et le respect des échéances.

- Suivre l'état d'avancement.
- Valider la qualité des livrables.
- Avoir une vision claire des prochaines échéances.

LIVRABLE	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	STATUT
Cadrage méthodologique	Équipe Cadrage	05/07	✓
Rapport collecte données	Équipe Données	15/08	✓
Benchmark international	Équipe Benchmark	30/08	⌚
Chapitre 1 - Cadre juridique	Équipe Juridique	30/09	⌚
Chapitre 2 - Financement	Équipe Financement	15/10	○
Synthèse et recommandations	Équipe Analyse	20/11	○
Livre Blanc final	Chef de projet	15/12	○

STATUT : ✓ Terminé ⌚ En cours ○ À faire

5 COMPTE-RENDU DE RÉUNION

EXEMPLE DE COMPTE-RENDU

Tracer les décisions, les actions et les responsabilités prises lors des réunions.

- Assure la communication et la transparence.
- Évite les malentendus.
- Sert de référence pour le suivi.

Réunion : Comité de pilotage - Suivi mensuel	POINTS ABORDÉS	DÉCISIONS / ACTIONS	RESPONSABLE	ÉCHÉANCE
Date : 10/07/2026	Avancement des axes	Accélérer la collecte de données sur l'axe 4 (Innovation)	Équipe Données	15/07
Participants : 8	Problèmes rencontrés	Difficulté d'accès à certaines sources internationales	Équipe Benchmark	15/07
Durée : 1h30	Ressources	Renfort ponctuel sur la rédaction chapitre 2	Chef de projet	20/07
Objectif : Suivre l'avancement et prendre les décisions clés.	Prochaine réunion	Validée pour le 07/08/2026	Tous	07/08

COMMENT CES OUTILS TRAVAILLENT ENSEMBLE ? (EXEMPLE DANS NOTRE PROJET DE VEILLE)



Le Kanban visualise le travail quotidien.



Le tableau de bord mesure l'avancement et les indicateurs.



Le registre des risques anticipe les problèmes potentiels.



Le suivi des livrables garantit la livraison dans les délais.



Le compte-rendu formalise les décisions et les actions.



Résultat : un projet de veille maîtrisé et un Livre Blanc de qualité !



BONNE PRATIQUE

Choisissez les outils adaptés à vos besoins, utilisez-les régulièrement et adaptez-les en fonction de l'évolution du projet. La clé est la simplicité, la rigueur et la collaboration.





Un projet de veille réussi repose autant sur la méthode que sur l'humain. Ces règles simples vous aideront à produire un Livre Blanc de qualité et utile aux décideurs.



1 COMPRENDRE LE BESOIN DÉCISIONNEL

Identifiez clairement les décisions à éclairer, les attentes des parties prenantes et les questions clés à résoudre.

EXEMPLE DANS NOTRE PROJET DE VEILLE (STARTUP ACT)

- Répondre aux questions du Ministère sur l'impact du Startup Act, son efficacité et les améliorations à apporter.



2 DÉFINIR UN OBJECTIF CLAIR

Formulez un objectif précis, mesurable et réaliste avec un périmètre bien défini.

- Produire un Livre Blanc complet avant le Forum ATVIC du 16 décembre 2026.



3 PLANIFIER AVANT D'AGIR

Prenez le temps de planifier : axes, méthodologie, ressources, calendrier, livrables et jalons.

- Définir les 12 axes de l'étude, les sources, le calendrier de chaque axe et les livrables intermédiaires.



4 RÉPARTIR CLAIREMENT LES RESPONSABILITÉS

Attribuez les rôles et responsabilités à chaque membre et assurez-vous que chacun connaît sa mission.

- Chaque équipe d'axe a un responsable et des membres, avec des tâches précises et des échéances.



5 UTILISER DES SOURCES FIABLES

Privilégiez des sources crédibles, vérifiables et diversifiées. Documentez toujours vos sources.

- S'appuyer sur les sources officielles, les rapports, les bases de données, les publications scientifiques et les experts.



6 COMMUNIQUER RÉGULIÈREMENT

Échangez souvent avec l'équipe et les parties prenantes. La communication évite les malentendus et les retards.

- Réunions hebdomadaires, points d'avancement et partage continu sur le Google Drive du projet.



7 SUIVRE L'AVANCEMENT AVEC DES INDICATEURS

Mesurez ce qui compte : avancement des tâches, collecte de données, analyses, rédaction... Adaptez si nécessaire.

- Suivre le % d'avancement par axe, le nombre de sources collectées, le respect des délais et la qualité des livrables.



8 GÉRER LES RISQUES DÈS LEUR APPARITION

Anticipez les risques, évaluez leur impact et mettez en place des actions préventives.

- Risque de manque de données, retard sur un axe, indisponibilité d'un membre : prévoir des solutions de repli et des marges.



9 CAPITALISER LES CONNAISSANCES ACQUISES

Documentez vos méthodes, vos difficultés et vos bonnes pratiques pour progresser et transmettre.

- Tenir un journal de bord, conserver les requêtes, les sources, les analyses et les retours d'expérience.



10 AMÉLIORER CONTINUUELLEMENT LE PROJET

À chaque étape, demandez-vous comment faire mieux et plus efficacement.

- Après chaque phase, faire un retour d'expérience et ajuster la méthode et les processus.

LA CHAÎNE DE VALEUR D'UN PROJET DE VEILLE



BESOIN

Identifier le besoin d'information et les questions clés.



OBJECTIFS

Définir les objectifs, le périmètre et les résultats attendus.



PLANIFICATION

Organiser le travail, les ressources et le calendrier.



COLLECTE

Collecter, filtrer et valider les données et informations.



ANALYSE

Analyser, comparer et interpréter pour produire du sens.



DÉCISION

Produire des recommandations utiles et exploitables.



CAPITALISATION

Partager les résultats, tirer les leçons et améliorer en continu.



UN PROJET DE VEILLE, C'EST AVANT TOUT UN TRAVAIL D'ÉQUIPE !

Méthode, rigueur, collaboration et curiosité sont les clés pour produire un Livre Blanc qui fait la différence et aide réellement à la prise de décision.



Procès-verbal de réunion

Projet : Étude stratégique sur le Startup Act tunisien

Réunion de démarrage – Phase 1 : Cadrage du projet

Date : 14 juillet 2026

Heure : 17h30

Mode : Google Meet

1. Informations générales

La réunion a débuté par un compte rendu de l'échange tenu avec M. Haythem, Président de l'ATVIC, et Mme Afef, Secrétaire Générale de l'ATVIC.

Les membres de l'équipe ont été informés que :

- l'ATVIC soutient officiellement le projet ;
- la proposition de collaboration a été validée ;
- l'ATVIC accompagnera scientifiquement le projet ;
- des attestations de contribution seront délivrées aux participants ;
- une attestation de stage d'été pourra être accordée aux étudiants les plus impliqués pendant la période estivale, selon les modalités définies par l'ATVIC.

2. Présentation de la Charte du projet

Une première version de la Charte du projet a été présentée aux participants.

Les différents éléments ont été discutés :

- vision du projet ;
- gouvernance ;
- méthodologie de travail ;
- exigences de qualité ;
- engagements des membres.

À l'issue des échanges, la proposition de charte a été accueillie favorablement et constitue la base de travail retenue pour le projet.

3. Organisation du projet

L'organisation générale du projet a été présentée aux participants.

Les principes suivants ont été validés :

- travail collaboratif par équipes ;
- démarche méthodologique commune ;
- production de livrables normalisés ;
- validation scientifique et contrôle qualité des travaux.

4. Présentation des axes de l'étude

Une première proposition des six axes de l'étude a été présentée :

1. État des lieux quantitatif du Startup Act
2. Cadre juridique et gouvernance
3. Financement des startups
4. Accompagnement et écosystème
5. Évaluation des impacts
6. Benchmark international

Il a été convenu que ces axes feront l'objet d'un travail de cadrage afin de confirmer leur périmètre, d'identifier d'éventuels axes complémentaires et d'affiner les questions de recherche.

5. Constitution du Comité de pilotage – Phase 1

Les étudiants volontaires ont été invités à rejoindre le premier Comité de pilotage chargé d'accompagner la phase de cadrage du projet.

Composition retenue :

- Syrine , Zaineb, Rahma, Chaker, Takwa et Mariem

Dans le cadre de cette première phase :

- Takwa et Mariem assureront également une mission spécifique de suivi qualité, en veillant à l'harmonisation et à la qualité des chartes de cadrage produites par les différentes équipes.

6. Décisions prises

- Validation de l'organisation générale du projet.
- Adoption de la Charte comme document de référence pour les travaux.
- Validation de la méthodologie proposée.
- Validation des six axes de travail comme base du cadrage.
- Constitution du premier Comité de pilotage.
- Mise en place d'un suivi qualité des livrables de cadrage.

7. Plan d'action avant la prochaine réunion

Comité de pilotage

- Organiser le suivi de la phase de cadrage.
- Préparer les outils de pilotage du projet.

Équipe Qualité

- Préparer un modèle (template) de la charte de cadrage qui sera utilisé par l'ensemble des groupes.
- Élaborer les critères d'évaluation des chartes de cadrage.
- Vérifier la conformité, l'harmonisation et la qualité des livrables produits.

Ensemble de l'équipe

- Choisir un à deux axes d'étude (**maximum trois**) pour rejoindre les groupes de travail, selon ses centres d'intérêt et ses compétences.
- Préparer la fiche de cadrage de l'axe retenu en définissant notamment :
 - le périmètre de l'étude ;
 - les objectifs ;
 - les questions de recherche ;
 - les premiers mots-clés ;
 - les sources documentaires prioritaires ;
 - les premiers éléments de veille.
